

# 2018 年乡村振兴战略—美丽新村建设 绩效评价报告

项目名称 2018 年乡村振兴战略—美丽新村建设

项目单位 南充市农业农村局

委托单位 南充市财政局

评价机构 四川金财纵横绩效管理咨询有限公司

2019 年 12 月

# 摘要

## 一、项目基本情况

为加快推进新村建设步伐，全面提升新村建设管理水平，确保圆满完成新村建设目标任务，根据《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强产村相融成片推进新农村建设的意见》（川委发〔2013〕2号）等文件要求，结合前一阶段新村建设和实际管理工作，2018年下达资金1838.7万元，统一以《南充市财政局关于下达2018年市级新村及农村改革发展专项资金的通报》（南财专〔2018〕914号）文件下达资金至各县。资金的使用在原则上都要用于幸福美丽川北新村规划编制和完善、新村聚居点和新农村综合主体建设、旧村落改造提升、传统村庄院落民居保护、主导产业培育、新村建设和管理机制创新等方面。

## 二、评价结论

评价工作组通过现场调研、询问座谈、问卷调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，2018年“乡村振兴战略——美丽新村建设”项目评价得分为：**90分**，专项综合绩效评定结论为：**优秀**。

## 三、存在主要问题

### （一）项目推进和资金支出进度偏慢

个别地方项目推进和资金支付进度偏慢，导致资金效益发挥不明显。

### （二）绩效管理意识有待加强

个别地方在项目管理上绩效意识淡薄，未及时进行年度绩效

评估，导致绩效目标无法量化，项目产生的效益有待考量。

### **（三）公告公示资料不全**

抽查发现，个别地方对项目和资金未按要求进行公告公示。

## **四、相关措施建议**

### **（一）加快项目推进和资金支付进度**

各地项目主管部门应加快项目推进，未完成的，督促施工方抓紧施工，已完成的，抓紧验收和完善相关项目资料，达到资金支付条件的，尽快拨付资金，充分发挥资金效益。

### **（二）强化绩效管理意识**

为保证专项资金效益能够最大化，可在项目规划时制定项目可量化的绩效目标，在项目完成后及时地对项目进行绩效测评。如：在项目的筹划阶段，一方面制定项目的总体绩效目标；另一方面，制定各个项目点位的绩效目标。在项目完成后及时进行绩效测评，衡量实际效益与预期效益的吻合度，确认专项资金的使用效益。

### **（三）强化公告公示制度执行**

对项目申报、实施、验收完成等进行公告公示，增强项目实施的透明度，接受群众监督。

# 正文目录

<b>一、项目基本情况</b> .....	<b>4</b>
(一) 项目内容.....	4
(二) 预算资金来源及使用情况.....	4
(三) 实施及管理情况.....	6
(四) 绩效目标及完成情况.....	7
<b>二、评价工作简述</b> .....	<b>7</b>
(一) 评价目的.....	7
(二) 评价思路及关注重点.....	7
(三) 评价方式方法及程序.....	8
(四) 评价指标体系及说明.....	9
(五) 选点及抽样调查.....	9
<b>三、评价结论及绩效分析</b> .....	<b>10</b>
(一) 评价结论.....	10
(二) 项目绩效分析.....	11
<b>四、存在主要问题</b> .....	<b>14</b>
(一) 项目推进和资金支出进度偏慢.....	14
(二) 绩效管理意识有待加强.....	15
(三) 公告公示资料不全.....	15
<b>五、相关措施建议</b> .....	<b>15</b>
(一) 加快项目推进和资金支付进度.....	15
(二) 强化绩效管理意识.....	15
(三) 强化公告公示制度执行.....	15
<b>六、附件</b> .....	<b>16</b>
附件 1: 绩效评价指标体系评分表.....	16
附件 2: 调查问卷汇总表.....	20

为进一步加强预算绩效管理，优化财政支出结构与资源配置，切实提高财政资金使用效益。根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号），四川金财纵横绩效管理咨询有限公司（以下简称“我公司”）受托对南充市农业农村局 2018 年度“2018 年乡村振兴战略——美丽新农村建设”项目支出进行绩效评价，我公司成立绩效评价工作组，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则开展评价工作，现将有关情况报告如下：

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目内容**

为加快推进新农村建设步伐，全面提升新农村建设管理水平，确保圆满完成新农村建设目标任务，根据《中共四川省委、四川省人民政府关于进一步加强产村相融成片推进新农村建设的意见》（川委发〔2013〕2 号）等文件要求，结合前一阶段新农村建设和实际管理工作，2018 年下达资金 1838.7 万元，统一以《南充市财政局关于下达 2018 年市级新村及农村改革发展专项资金的通知》（南财专〔2018〕914 号）文件下达资金至各县。资金的使用在原则上都要用于幸福美丽川北新村规划编制和完善、新村聚居点和新农村综合主体建设、旧村落改造提升、传统村庄院落居民保护、主导产业培育、新村建设和管理机制创新等方面。

### **（二）预算资金来源及使用情况**


《南充市财政局关于下达 2018 年市级新村及农村改革发展专项资金的通知》（南财专〔2018〕914 号）文件下达资金

至各县，下达资金共计 1838.7 万元。资金来源南充市本级财政资金，专项资金到位及时，到位率 100%。

截止 2018 年 12 月 31 日，财政资金支付 1838.7 万元。资金主要用于幸福美丽川北新村规划编制和完善、新村聚居点和新农村综合主体建设、旧村落改造提升、传统村庄院落民居保护、主导产业培育、新村建设和管理机制创新等方面。资金具体安排情况见表 1-1，图 1-1。

**表 1-1 南充市乡村振兴战略-美丽新村建设资金安排情况**

地区	财政资金（万元）	比率（%）
顺庆区	185	10.06%
高坪区	284	15.45%
嘉陵区	240.7	13.09%
阆中市	104	5.66%
南部县	146	7.94%
西充县	388	21.10%
仪陇县	131	7.12%
营山县	126	6.85%
蓬安县	174	9.46%
<b>合计</b>	<b>1838.7</b>	<b>100%</b>

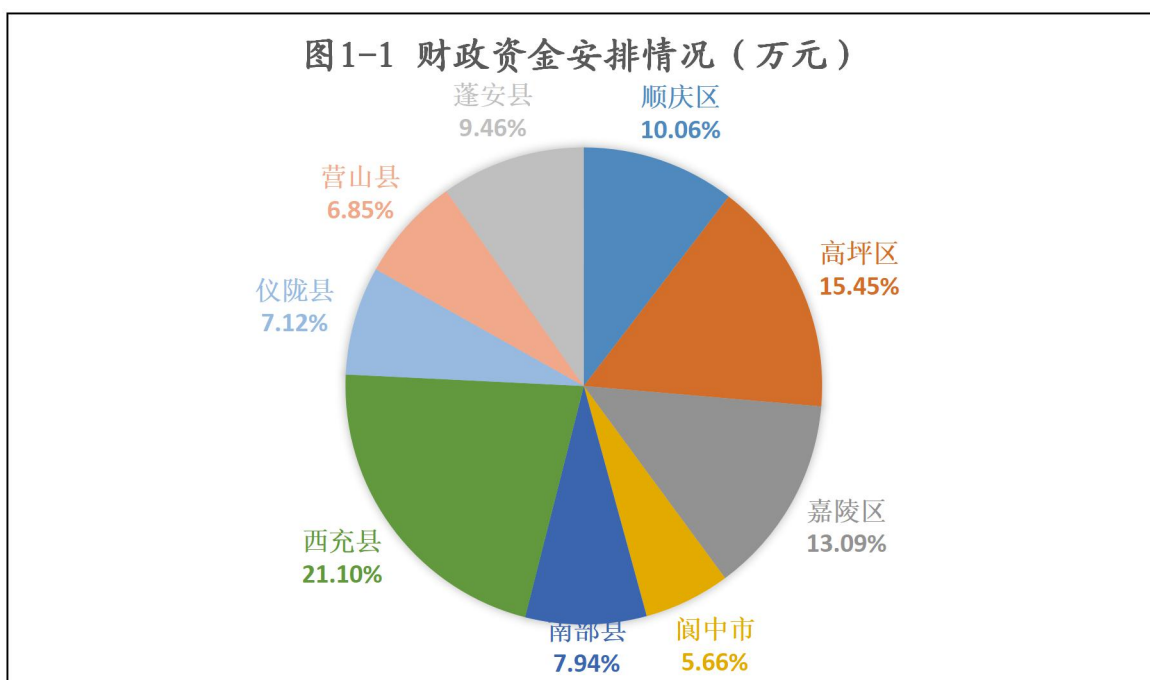

根据南充市财政局关于印发《南充市财政支农资金管理办法（暂行）》（南财农〔2015〕71号）的通知的相关规定，文件要求各点位要严格执行专项资金管理的有关规定，加强管理，专款专用，提高资金使用效益，促进支农资金管理科学化、规范化。通过对项目抽查，发现各点位会计制度健全规范，未发现有重大违规使用资金的情况。

### （三）实施及管理情况

由行政村和新型农业经营主体申请，制定项目实施方案，报县（市、区）农业农村局和财政局共同审批后实施，项目完成后，由农业农村局和财政局共同验收合格后，由县级财政（顺庆区、阆中市、南部县、仪陇县、营山县、蓬安县）或农业农村局（高坪区、嘉陵区、西充县）资金平台统一支付。该资金实施项目检查验收均由各县（市、区）农业农村局负责管理。该资金实施项目监管由各县（市、区）农业农村局，部分县（区）

交由乡镇负责监管。

#### **（四）绩效目标及完成情况**

##### **1.绩效目标**

新村建设专项资金主要用于行政，特别是有新村建设任务的村和部分新型农业经营主体的基础设施建设。

专项资金共安排行政村 37 个、114 个新型经营主体，各个村实施的项目正在有序进行。

各行政村、新型农业经营主体根据发展需要，编制实施项目建设内容，经过审批后按相关管理办法组织实施。

##### **2.绩效目标完成情况**

该资金实施的项目经过所属主管部门的监管，所有的项目均已全部完成。该资金主要用于农村公路、新村附属设施、产业基础设施等建设，极大地发挥了改善农村环境、助推产业发展的作用。

## **二、评价工作简述**


### **（一）评价目的**

按照项目决策、管理及效果三类指标，对项目决策、资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价项目决策与资金使用的科学性、合理性和有效性，发现存在的问题并分析原因，提出完善资金管理的制度机制、提升资金使用效益相关建议，进一步加强专项资金管理，提高资金使用效益和优化资源配置，为以后年度相关决策及预算安排提供参考依据。

### **（二）评价思路及关注重点**



图 2-1 总体评价思路

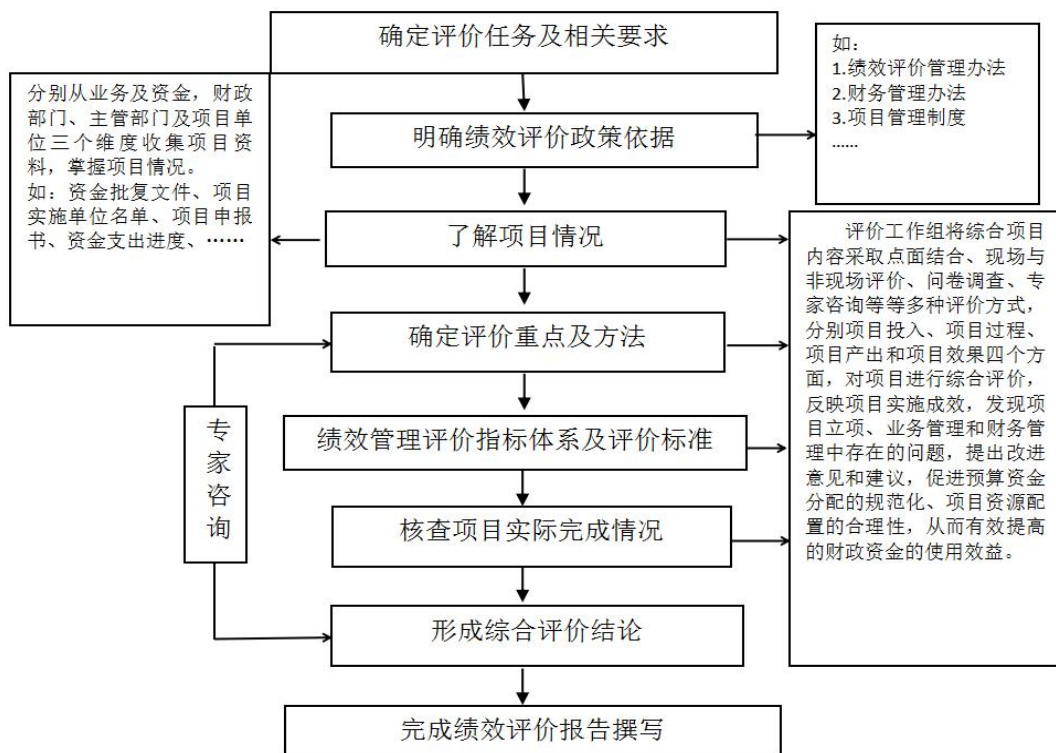

评价关注重点：①项目的总体规划；②资金分配结果的公平、公正性；③项目过程管理的及时性；④补助成效及社会公众满意度等。

### （三）评价方式方法及程序

本次评价采取全面评价和重点评价相结合、现场评价和非现场评价相结合、定性和定量相结合的方式，并采取座谈询问、实地考察、分析对比、调查问卷等多种方法开展评价。

评价工作分为评价工作前期准备、实施评价和形成报告三个阶段。各阶段主要工作内容：

✧ **前期准备阶段：**收集相关的政策、文件资料，了解项目情况，确定评价重点及思路，根据项目特点制定评价指标体系、调查问卷、基础数据表等工作底稿，并通知项目单位准备相关资料；

◇ **实施评价阶段**：进驻现场实地调研，核查资料，面对面访谈询问，抽样选点，实地勘察及入户调查，评议打分等；

◇ **报告撰写阶段**：整理、分析并复核项目资料，形成初步评价结果，撰写评价报告初稿，征求委托单位和项目单位意见后定稿。

#### **（四）评价指标体系及说明**

根据《南充市财政局关于开展 2019 年财政绩效评价工作的通知》（南财预〔2019〕14 号）的指标体系框架，结合项目实际情况与特点，在与专家组、项目单位充分协商的基础上，评价工作组细化了该专项的绩效评价指标体系，详见附件 1。

评价指标体系总分为 100 分，包括项目决策、项目管理、项目绩效三个一级指标，同时针对一级指标制定二、三、四级指标，其中决策 20 分，项目管理 25 分，项目绩效 55 分。

指标体系得分计算过程如下：

二级指标得分 =  $\Sigma$  本级所含有的三级指标得分

一级指标得分 =  $\Sigma$  本级所含有的二级指标小计得分

绩效评价综合绩效级别分为 4 个等级：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 75-90 分（含 75 分）为良好；

综合得分在 60-75 分（含 60 分）为一般；

综合得分在 60 分以下为较差。

#### **（五）选点及抽样调查**

本项目涉及的项目单位为南充市行政辖区内的行政村 37 个、114 个新型经营主体，支持对象为学校，本次评价选取本

项目中的 6 个获得资助的项目单位，对该项目进行调查，选取当地社会大众进行问卷调查，取得调查问卷 120 份。

### 三、评价结论及绩效分析


#### (一) 评价结论

评价工作组通过现场勘察、询问座谈、入户调查、资料核查、比对分析等多种方式方法综合评价，本项目综合得分：**90**分，专项综合绩效评定结论为：**优秀**。

项目决策、管理及绩效总体得分情况见表 2-1、图 2-1，各项具体指标评分情况见附件 1《指标体系及评分情况表》。

**表 2-1 2018 年度乡村振兴战略-美丽新村建设资金评分简表**

一级指标	二级指标	赋分值	评价得分	得分率
项目决策	绩效目标	6	4.80	80%
	决策依据	7	5.60	80%
	资金分配	4	2.60	65%
	分配结果	3	2.80	93.33%
①项目决策方面评价		20	15.80	79%
项目管理	资金到位	6	6	100%
	资金管理	6	5	83.33%
	财务管理	4	4	100%
	组织实施	9	9	100%
②项目管理方面评价		25	24	96%
项目绩效	项目完成	20	20	100%
	项目效益	30	25.20	84%
	满意度	5	5	100%
③项目绩效方面评价		55	50.20	91.27%
合 计		100	90	90%

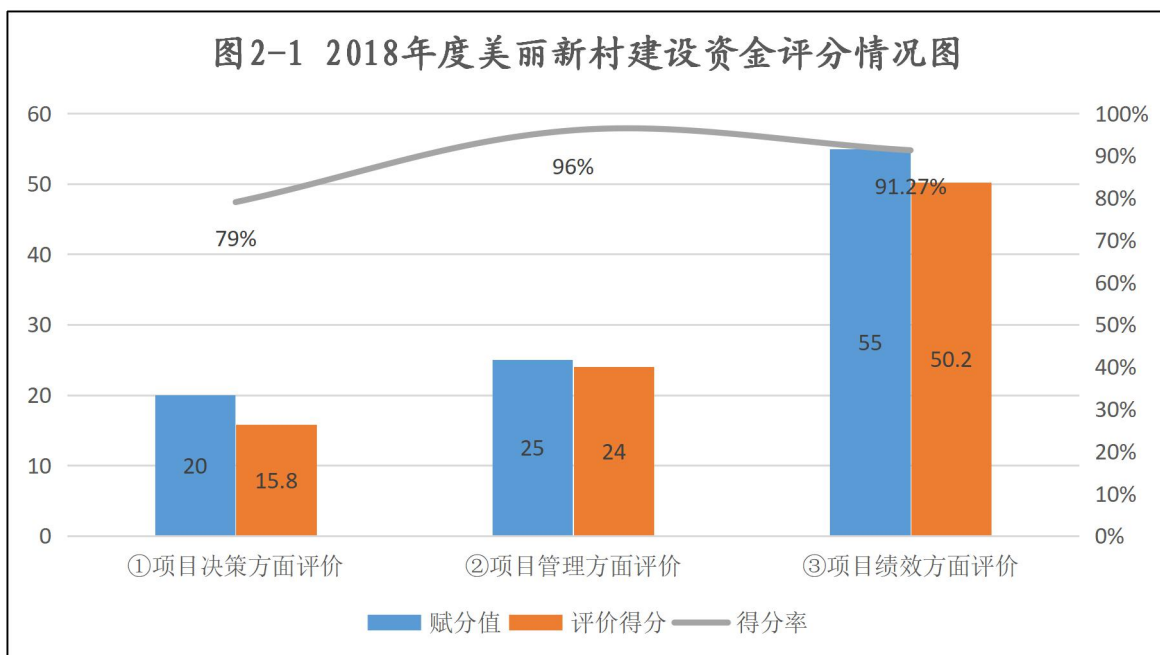

从项目决策、项目管理、项目绩效三方面总体分析如下：

✧ **项目决策方面：**项目实施符合党中央、国务院和省、省政府决策部署，符合当前经济社会发展需要，但也存在绩效目标量化细化程度不足。

✧ **项目管理方面：**资金到位及时，现场查阅资料未发现有会计核算不规范的情况，但项目实施过程监管有待加强。

✧ **项目绩效方面：**该项目修建了农村公路、新村附属设施、产业基础设施等建设，极大地发挥了改善农村环境、助推产业发展的作用。但由于资金分散面广、金额分散不均衡，其作用有限。

## （二）项目绩效分析

### 1.项目决策

项目决策指标下设 4 个二级指标、10 个三级和 13 个四级指标，分值 20 分，评价得分 15.80 分，得分率 79%。

扣分原因：未发现明确、可量化的目标，扣 0.4 分；未发现分布实施步骤和分步完成时间，扣 0.4 分；绩效目标不可量化，无法衡量与实际的吻合度，扣 0.4 分；未发现长期实施规划的项目、阶段性或短期性目标，扣 1 分；实施规划合理性和适时性有待加强，扣 0.2 分；无明确分配标准和要素，扣 0.4 分；西充县的项目未发现申请书，扣 1 分；区县间资金分配金额不均衡，扣 0.2 分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表 2-2。

表 2-2 项目决策类指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标/ 指标值	分值	评价得分	得(扣)分原因说明
1.绩效目标	目标内容	清晰明确	2	1.6	未见明确、可量化的目标。
	进度计划	明确	2	1.6	未发现分布实施步骤和分步完成时间
	目标匹配	符合实际	2	1.6	绩效目标不可量化，无法衡量与实际的吻合度。
2.决策依据	政策依据	符合实际	2	2	符合四川省幸福美丽新村建设推进工作。
	实施规划	连续性	1	0	未发现长期实施规划的项目、阶段性或短期项目目标。
		合理性	1	0.8	实施规划合理性有待加强。
		适时性	1	0.8	实施规划适时性有待加强。
	管理制度	健全完善	1	1	有专项资金管理办法
内容明确		1	1	项目资金管理办法明确。	
3.资金分配	分配方法	科学合理	2	1.6	无明确分配标准和要素。
	分配过程	符合规定	2	1	西充县的项目未发现申请书。
4.分配结果	审核把关	据实申报	2	2	未发现虚报项目的情况。
	资金均衡	均衡合理	1	0.8	区县间资金分配不均衡。
合 计			20	15.8	

## 2.项目管理

项目管理指标下设 4 个二级指标、10 个三级和 11 个四级

指标，分值 25 分，评价得分 24 分，得分率 96%。

扣分原因：带帽下达项目，缺乏相应的过程管理和监控机制，扣 1 分。每项指标的详细内容、评分情况及扣分原因见表 2-3。

表 2-3 项目管理指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得（扣）分原因说明
1.资金到位	分配时效	市级分配	2	2	市级分配资金及时。
		区县级分配	2	2	区县间分配资金及时。
	资金拨付	及时	2	2	资金分配及时。
2.资金管理	资金使用	合规	4	4	未发现不合规的情况。
	资金监管	监管严密	2	1	带帽下达项目，缺乏相应的监控机制。
3.财务管理	财务制度	健全	2	2	未发现不规范的情况。
	会计核算	规范	2	2	未发现不规范的情况。
4.组织实施	项目调整	调整程序	2	2	未发现项目调整严格不履行相关手续的情况。
	投资变更	投资变更率	2	2	此项目不涉及
	制度健全	健全	2	2	项目管理制度健全
	制度执行	严格执行	3	3	未发现不合规的情况。
合 计			25	24	

### 3.项目绩效

项目绩效指标下设 3 个二级指标、8 个三级和 12 个四级指标，分值 55 分，评价得分 50.2 分，得分率 91.27%。

扣分原因：通过改善基础设施问题，提高当地居民的经济是有限的，扣 2 分；居民的居住周围的基础设施建设不完善（道路仍有地方未修通），扣 0.8 分；资金管理混乱，项目过程管理缺失，资金使用效益未达预期目标，扣 2 分。每项指标的详

细内容、评分情况及扣分原因见表 2-4。

表 2-4 项目绩效指标得分情况表

二级指标	三级指标	四级指标	分值	评价得分	得（扣）分原因说明
1.项目完成	完成数量	目标任务量达成率	6	6	项目均已完成。
	完成质量	验收合格	6	6	未发现项目完成存在质量问题。
	完成时效	及时性	4	4	未发现项目完成滞后的情况。
	完成成本	成本节约率	4	4	项目实施未超出预算。
2.项目效益	经济效益	农民年均收入增长率	10	8	通过改善基础设施问题，提高当地居民的经济是有限的。
	社会效益	改善居住环境	4	3.2	居民的居住周围的基础设施建设不完善。（道路仍有地方未修通）
		幸福感提升	4	4	据问卷调查结果显示，居民的幸福感有提升。
		示范效应	4	4	美丽新村建设对周边农村有示范引领作用。
	助推产业发展	3	3	新村建设促进产业发展。	
可持续效益	—	5	3	资金管理混乱，项目过程管理缺失，资金使用效益未达预期目标。	
3.满意度	对象满意度	群众满意度	3	3	根据现场访问以及问卷调查，结果显示群众满意度达到 100%。
		干部满意度	2	2	根据现场访问以及问卷调查，结果显示当地干部满意度达到 100%。
合计			55	50.2	

## 四、存在主要问题

### （一）项目推进和资金支出进度偏慢

个别地方项目推进和资金支付进度偏慢，导致资金效益发挥不明显。专项资金虽较好的发挥了正向激励作用，但个别项目资金投入小，并与其他资金整合使用。间接影响项目推进和资金支付进度，资金的年度效益发挥不够明显。

## **（二）绩效管理意识有待加强**

个别地方在项目管理上绩效意识淡薄，未及时进行年度绩效评估，导致绩效目标无法量化，项目产生的效益有待考量。

## **（三）公告公示资料不全**

抽查发现，个别地方对项目和资金未按要求进行公告公示。公示板公开的信息有限，未将所有项目资料和资金使用办法以及获奖人数名单进行公开公布。

# **五、相关措施建议**

## **（一）加快项目推进和资金支付进度**

各地项目主管部门应加快项目推进，未完成的，督促施工方抓紧施工，已完成的，抓紧验收和完善相关项目资料，达到资金支付条件的，尽快拨付资金，充分发挥资金效益。可适当将资金集中化，使得资金能产生的效益更显著。

## **（二）强化绩效管理意识**

为保证专项资金效益能够最大化，可在项目规划时制定项目可量化的绩效目标，在项目完成后及时地对项目进行绩效测评。如：在项目的筹划阶段，一方面制定项目的总体绩效目标；另一方面，制定各个项目点位的绩效目标。在项目完成后及时进行绩效测评，衡量实际效益与预期效益的吻合度，确认专项资金的使用效益。

## **（三）强化公告公示制度执行**

对项目申报、实施、验收完成等进行公告公示，增强项目实施的透明度，接受群众监督。各地方部门必须严格按照相应的规章制度执行，做到信息的透明化。坚持公平、公开、公正



的原则，全心全意为人民服务。

## **六、附件**

**附件 1：绩效评价指标体系评分表**

**附件 2：调查问卷汇总表**

附件 1: 2018 年乡村振兴战略-美丽乡村建设资金绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	指标解释/评价内容(公式计算结果=x)	评分标准(得分比值)					评价得分	得(扣)分原因说明
						差	较差	一般	较好	好		
						0	0.3	0.6	0.8	1		
合计				100						90		
项目决策 (20分)	绩效目标 (6分)	目标内容 (2分)	清晰明确	2	项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确性	4处及以上不明确	3处不明确	2处不明确	1处不明确	明确	1.6	未见明确、可量化的目标。
		进度计划 (2分)	明确	2	项目计划实施进度明确	不明确		基本明确		明确	1.6	
		目标匹配 (2分)	符合实际	2	绩效目标设定符合实际需求	4处及以上不匹配	3处不匹配	2处不匹配	1处不匹配	匹配	1.6	绩效目标不可量化,无法衡量与实际的吻合度。
	决策依据 (7分)	政策依据 (2分)	符合实际	2	项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署;符合当前经济社会发展需要	不符合				符合	2	符合四川省幸福美丽乡村建设推进工作。
		实施规划 (3分)	连续性	1	连续性项目根据需要制定中长期实施规划	无				有	0	未发现长期实施规划的项目、阶段性或短期项目
			合理性	1	实施规划符合实际	不符合		基本符合		符合	0.8	实施规划合理性有待加强。
			适时性	1	实施规划有无根据变化适时调整	无				有	0.8	实施规划适时性有待加强。
		管理制度 (2分)	健全完善	1	是否制定项目资金管理办法	无				有	1	有专项资金管理办法
			内容明确	1	项目资金分配决策程序明确	不明确		基本明确		明确	1	项目资金管理办法明确。
	资金分配 (4分)	分配方法 (2分)	科学合理	2	资金分配方法是否科学合理	不合理		一般		合理	1.6	无明确分配标准和要素。
		分配过程 (2分)	符合规定	2	分配过程符合相关规定	不符合				符合	1	西充县的项目未发现申请书。
	分配结果 (3分)	审核把关 (2分)	据实申报	2	符合申报条件的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%	否				是	2	未发现虚报项目的情况。

项目决策 (20分)	分配结果 (3分)	资金均衡 (1分)	均衡合理	1	按实际分配结果选择客观因素测算验证资金分配方法制定、分配要素设定、基础数据应用、测算依据选取等是否科学合理	不合理		较合理		合理	0.8	区县间资金分配不均衡。
	项目管理 (25分)	资金到位 (6分)	分配时效 (4分)	市级分配	2	市级主管部门按规定及时提出资金分配方案送审	$240日 < x$	$180日 < x \leq 240日$	$120日 < x \leq 180日$	$60日 < x \leq 120日$	$x \leq 60日$	2
区县级分配				2	县区财政部门按规定及时分配资金	不及时				及时	2	区县间分配资金及时。
资金拨付 (2分)			及时	2	按规定及时拨付资金	严重滞后	滞后	较滞后	较及时	及时	2	资金分配及时。
资金管理 (6分)		资金使用 (4分)	合规	4	资金使用范围、程序、标准等是否合规	每发现1处不合规，扣1分，直到扣完为止					4	未发现不合规的情况。
		资金监管 (2分)	监管严密	2	资金监督管理是否履行，是否建立资金监管制度并实施资金监控相关措施	否				是	1	带帽下达项目，缺乏相应的监控机制。
财务管理 (4分)		财务制度 (2分)	健全	2	财务制度健全，管理规范	不规范		较规范		规范	2	未发现不规范的情况。
		会计核算 (2分)	规范	2	会计核算规范	不规范		较规范		规范	2	未发现不规范的情况。
组织实施 (9分)		项目调整 (2分)	调整程序	2	项目调整严格履行相关手续	未履行				履行	2	未发现项目调整严格不履行相关手续的情况。
		投资变更 (2分)	投资变更率	2	项目投资变更额/项目总投资*100%	$20% < x$	$15% < x \leq 20%$	$10% < x \leq 15%$	$5% < x \leq 10%$	$x \leq 5%$	2	此项目不设置
		制度健全 (2分)	健全	2	项目管理制度健全	无		基本健全		健全	2	项目管理制度健全
	制度执行 (3分)	严格执行	3	是否严格执行项目有关制度规定	不严格		较严格		严格	3	未发现不合规的情况。	
项目完成 (20分)	完成数量 (6分)	目标任务量达成率	6	实际完成任务量/绩效目标设定任务量*100%	$x < 85%$	$85% \leq x < 90%$	$90% \leq x < 95%$	$95% \leq x < 100%$	$x = 100%$	6	项目均已完成。	

项目绩效 (55分)	项目完成 (20分)	完成质量 (6分)	验收合格	6	验收合格抽样个数/验收项目抽样总数×100%	$x < 85\%$	$85\% \leq x < 90\%$	$90\% \leq x < 95\%$	$95\% \leq x < 100\%$	$x = 100\%$	6	未发现项目完成存在质量问题。
		完成时效 (4分)	及时性	4	(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	4	未发现项目完成滞后的情况。
		完成成本 (4分)	成本节约率	4	(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%	$x > 15\%$	$15\% \geq x > 10\%$	$10\% \geq x > 5\%$	$5\% \geq x > 0$	$x \leq 0$	4	项目实施未超出预算。
	项目效益 (30分)	经济效益 (10分)	农民年均收入增长率	10	是否提高了当地居民经济	不能	不明显	较明显	明显	显著	8	通过改善基础设施问题,提高当地居民的经济是有限的。
		社会效益 (15分)	改善人居环境	4	是否改善了人居环境	不能	不明显	较明显	明显	显著	3.2	居民的居住周围的基础设施建设不完善。(道路仍有地方未修通)
			幸福感提升	4	项目实施对幸福感是否有提升	否				是	4	据问卷调查显示,居民的幸福感的提升。
			示范效应	4	美丽新村建设对周边农村是否有示范引领作用	无	不显著	一般	较显著	非常显著	4	美丽新村建设对周边农村有示范引领作用。
			助推产业发展	3	新村建设是否促进产业发展	否				是	3	新村建设促进产业发展。
		可持续效益 (5分)	—	5	根据其他项目效益指标综合判断可持续效益	持续性强 3分, 较强 2分, 一般 1分, 无 0分。					3	资金管理混乱,项目过程管理缺失,资金使用效益未达预期目标。
	满意度 (5分)	对象满意度 (5分)	群众满意度(3)	3	新村农民对环境改善否满意	受益群体满意度= $\sum n_i p_i / \sum n_i \times$ 分值。其中:n-受访者数量;p-满意度权重;i-满意状态					3	根据现场访问以及问卷调查,结果显示群众满意度达到100%。
			干部意度(2)	2	相关部门对建设情况是否满意						2	根据现场访问以及问卷调查,结果显示当地干部满意度达到100%。

附件 2: 调查问卷汇总表

乡村振兴战略——美丽新农村建设资金实施情况调查问卷				
序号	问题	选项	份数 (120)	比例
1	您是否了解美丽新农村建设资金政策?	A.了解	107	89.17%
		B.不了解	13	10.83%
2	您申请美丽新农村建设资金多久后收到资金?	A.1 个月以内	103	85.83%
		B.1-3 个月	17	14.17%
		C.3 个月以上	0	0.00%
3	您所在地区开展的新村建设是否提高周边村进行新农村建设的积极性?	A.显著提高	98	81.67%
		B.提高	20	16.67%
		C.无变化	2	1.67%
		D.降低	0	0.00%
4	您认为您的居住环境是否有明显改善?	A.显著改善	109	90.83%
		B.改善	11	9.17%
		C.无变化	0	0.00%
		D.更糟糕	0	0.00%
5	您认为美丽新农村建设实施后对以下哪些项目有经济项目有带动作用?	A.垃圾治理	76	63.33%
		B.污水处理	79	65.83%
		C.道路硬化	104	86.67%
		D.公厕建设	87	72.50%
		E.涉农项目整合	69	57.50%
		F.其他	20	16.67%
6	您领取美丽新农村建设资金用于哪些方面? (多选)	A.新村规划和编制	99	82.50%
		B.新农村综合体建设	35	29.17%
		C.旧村落改造	64	53.33%
		D.传统村庄院落民居保护	43	35.83%
		E.主导产业培育	34	28.33%
		F.新村建设	78	65.00%
7	您认为美丽新农村建设项目将您的收入水平提高多少?	A.0	0	0.00%
		B.1000-5000 元	56	46.67%
		C.5000-10000 元	60	50.00%
		D.10000 元以上	4	3.33%
8	你对美丽新农村建设政策的是否满意?	A.非常满意	78	65.00%
		B.比较满意	40	33.33%
		C.满意	2	1.67%
		D.不满意	0	0.00%
9	上级部门是否在美丽新农村建设过程中, 派专人对对资金使用进行监督?	A.是	88	73.33%
		B.否	32	26.67%
10	美丽新农村建设项目是否提升您的幸福感?	A.显著提升	95	79.17%
		B.提升	20	16.67%
		C.无变化	5	4.17%
		D.降低	0	0.00%
